




设备、工装(模具、夹具、检具、治具)预验收报告

表单编号 GR-54-04-11 (A/1)
纸张 A4(210×297)
顺序号

项目代码	ZY2250	设计单位	沧州啸宇模具科技有限公司	编制	
设备工装名称	气囊下支架-冲压模具	制造单位	沧州啸宇模具科技有限公司	审核	
设备工装编号	SQX3000-6805432-MJ-01/02/03	验收日期	2023-5-30	批准	
工装类别	冲压模具	验收数量	3	批准日期	

设备工装实物图例

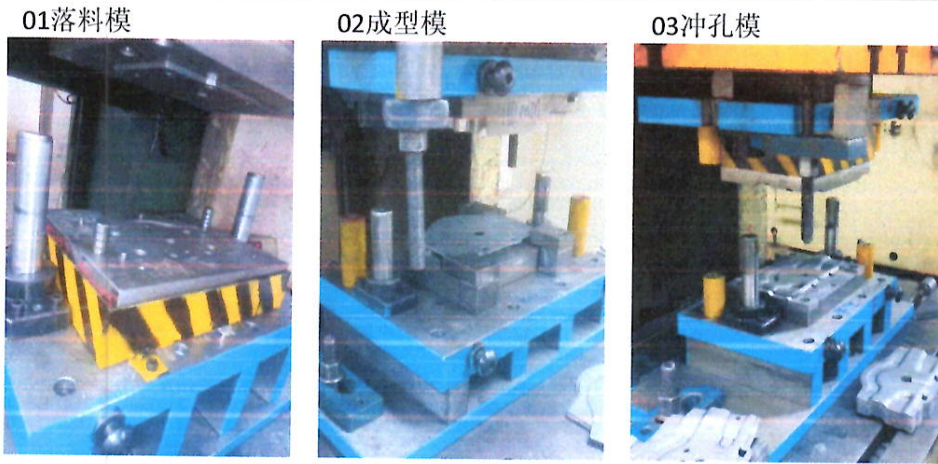

验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 有条件接受
验收的依据	<input type="checkbox"/> 数模	<input type="checkbox"/> 2D图	<input checked="" type="checkbox"/> 小批量试生产
试生产产品的数量	<input checked="" type="checkbox"/> 100~200套	<input type="checkbox"/> >200套	<input type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月

验收项目	设备外表处理	<input type="checkbox"/> 防锈	<input type="checkbox"/> 没有防锈	<input checked="" type="checkbox"/> 不需防锈
	操作的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 操作方便	<input type="checkbox"/> 操作不方便	
	生产的稳定性	<input checked="" type="checkbox"/> 稳定	<input type="checkbox"/> 不稳定	
	使用的安全性	<input checked="" type="checkbox"/> 安全	<input type="checkbox"/> 不安全	
	装拆的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 方便	<input type="checkbox"/> 不方便	
	铭牌位置内容	<input checked="" type="checkbox"/> 正确	<input type="checkbox"/> 不正确	
	附件清单	<input checked="" type="checkbox"/> 模具2D图纸	<input checked="" type="checkbox"/> 模具3D数据	<input type="checkbox"/> 模具检查报告书

补充说明
存在小问题：1、模具未标识“F”；2、落料模，料片卡在板条上；3、成型模，限高柱是下限位，需改成上、下限位；
4、冲孔模，孔尺寸超上差0.01-0.04mm；5、外形尺寸229mm处，偏大0.8-1mm。
处理方式：问题1、2、3、4，在交模前，由啸宇调整并消除；问题5，试装样件满足要求，按实际尺寸接受。

验收会签	采购部	
	制造工程部	张华 2023.05.31
	设备工装使用单位	冯敬东 2023.05.31
	质量部	
	其他会签	
